
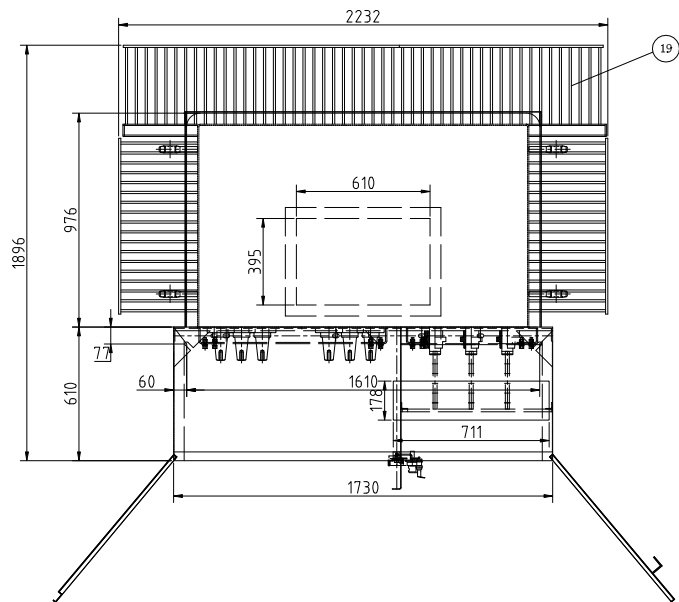


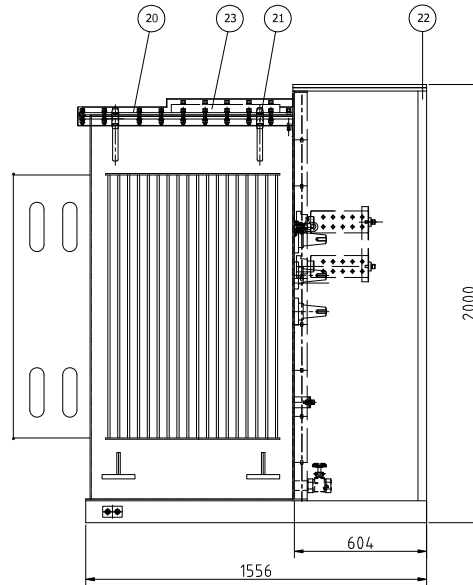


No de dessin d'atelier DA-EL-17	Discipline Électricité
Entrepreneur général Beaudoin Canada 95 boul. de la Technologie, Gatineau, J8Z 3G4. A/S Louis-Philippe D'Aoust	Description Transformateurs sur socle, à liquide diélectrique, moyenne tension 3000KVa 53TR107
Sous-traitant Seguin Morris Inc. 620 rue de Vernon, Gatineau QC J9J 3K5 A/S Mario Blondin Téléphone : 819 776-3939	Secteur Usine Secteur 5300
Fournisseur Domino High Voltage 200-15117 101 Ave Surrey, BC V3R 8P7 A/S Kate Zeilinger Téléphone : 604.780.9579	Réception WSP
Référence au devis Section : 26 12 19	Commentaires WSP
Référence au plan 15-5105-G729-5300-400-201	


Effacer tout

Nomenclature : DA-LL-NN-vXX


LL	NN	XX
CV = Civil MB = Mécanique de bâtiment MP = Mécanique de procédés EL = Électricité AU = Automatisation ST = Structure AR = Architecture	Numéro incrémental, indépendant de la discipline	Version incrémentale

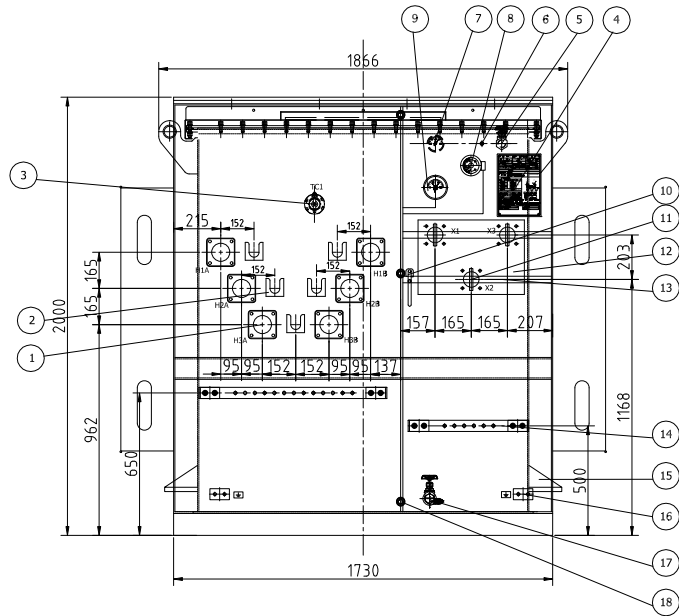


OIL LEVEL GAUGE



OIL TEMPERATURE GAUGE



X1:BODY PROTECTION WIRING TERMINAL		
JOINT	N.O.	CONNECTOR FUNCTION
1	2	OIL LEVEL GAUGE
2	3	
3	4	
4	5	
5	6	
6	7	
7	8	
8	9	
9	10	
10		

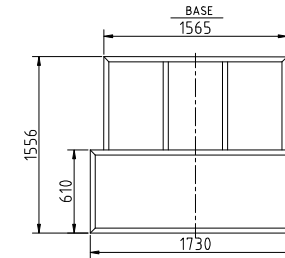

TECHNICAL DATA

RATING	3000kVA
PRIMARY VOLTAGE(V)	4160 DELTA
SECONDARY VOLTAGE(V)	600Y/347
FREQUENCY	60Hz
VECTOR GROUP	Dyn1
CONDUCTOR	COPPER
INSULATING OIL	MINERAL OIL (45#)
TEMPERATURE RISE	65°C
EFFICIENCY	99.37%
LOAD LOSS AT RATED VOLTAGE	22000W
NO LOAD LOSSES	3500
IMPEDANCE	5.5%
ALTITUDE	≤1000m
No. OF TAP POSITION	5
COLOR	MENNSELL GREEN
CORE FORM	Three-phase Three-column

PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	QTY
1	HV BUSHING (15KV,600A)	6
2	PARKING STAND BRACKET	5
3	TAP CHANGER 3PH (WSTII3 500/10-6×5)	1
4	NAMEPLATE	1
5	1" UPPER FILL VALVE	1
6	PRESSURE RELIEF VALVE	1
7	VACUUM PRESSURE GAUGE	1
8	OIL LEVEL GAUGE W/AIARM CONTACTS	1
9	OIL TEMPERATURE GAUGE W/AIARM CONTACTS	1
10	DOOR HANDLE	1
11	LV BUSHING(10 HOLE)	4
12	750-4000 PADMOUNT LV PLATE, 304L S.S. 3/16in	1
13	LV BUSHING ADDITIONAL SUPPORT	2
14	GROUND BUS	2
15	JACK	4
16	GROUND STEEL PADS	4
17	1"DRAIN VALVE WITH 3/8" SAMPLER	1
18	FIXED PROJECTING CUP	3
19	RADIATOR	3
20	FLIP TOP COVER	1
21	LIFTING LUG	4
22	HINGED DOOR	2
23	HANDHOLE	1
24	TANK BASE	1

TYPE
ZGS-H-3000/4.16-0.6

DWG. NAME

General Assembly Drawing

DRAWN CHECKED CHECKED APPROVED

Mike W Ella W Iris J Sam

FIRST ANGLE

PROJECTION

SCALE

1



JIEZOU POWER

REV. NO.




Mario Blondin

Digitally signed by Mario Blondin
DN: C=CA,
E=mblondin@seguinmorris.com,
O=Seguin Morris, OU=Division Énergie -
Energy Division, CN=Mario Blondin
Location: Gatineau
Reason: I am approving this document
Contact Info: 8196357434
Date: 2023.12.22 11:35:20-05'00'

ZGS-H-3000-231009-01

ZGS-H-3000-231009-01

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS & [IN]
2. MATERIAL: STAINLESS STEEL
3. THICKNESS : 1mm
4. LETTER COLOR: BLACK

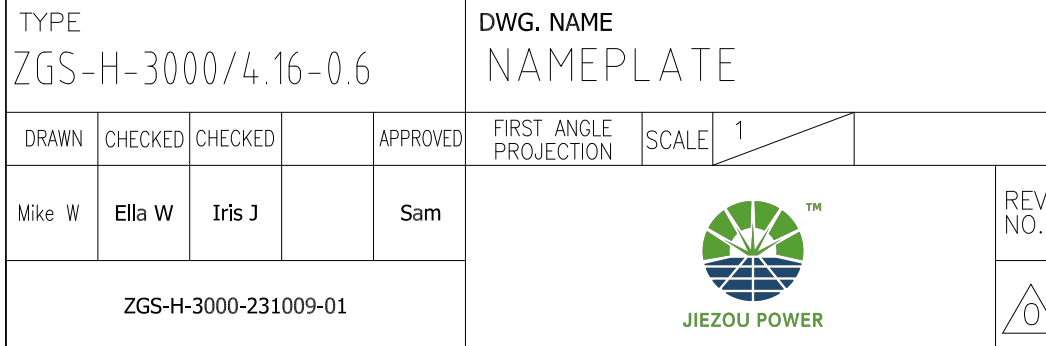

Digitally signed by Mario Blondin
DN: C=CA,
E=mblondin@seguinmorris.com,
O=Seguin Morris, OU=Division Énergie
- Energy Division, CN=Mario Blondin
Location: Gatineau
Reason: I am approving this document
Contact Info: 8196357434
Date: 2023.12.22 11:35:33-05'00'


2023-11-21

Voici les réponses du fabricant en mauve (j'ai enlevé les items qui sont OK afin d'alléger le texte) :

1. WSP : Note que mon commentaire #2 n'est pas approprié, désolé. Car, ne concerne que les transformateurs secs. Il s'agit en réalité du CAN/CSA-C2-M91 (Version en vigueur), Single-Phase and Three-Phase Distribution.

WSP : Le fournisseur ne semble pas confirmer la norme indiquée ici.

Manufacturier : CAN/CSA-C2-M91 is a general standard. Specifically for this project, it is a three-box transformer. The more detailed standard is CSA C227.4, which has been reflected in your reference drawings and our production drawings. We confirm.

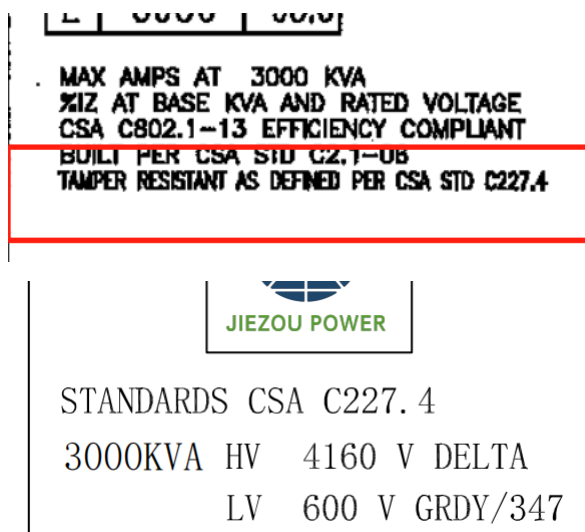

2. WSP : Nous avons effectué certaines recherches et avons compris que le produit et/ou le fabricant ne sont pas listés chez CSA. On peut donc comprendre qu'aucune ligne de produit n'est autorisée à être vendue au Canada. Nous comprenons que l'approbation CSA se fait donc à la pièce chez le fabricant. La certification sera requise tel qu'indiqué au devis 26 05 01 et ailleurs dans les documents, peu importe votre lecture du devis, il ne s'agit pas seulement de construire selon les normes CSA, il faut aussi avoir la certification, surtout qu'il s'agit d'un produit asiatique.

Pour cette situation particulière, WSP n'est pas à l'aise d'apposer un tampon d'approbation sur le DA. Nous pouvons toutefois valider que l'ensemble des éléments techniques répondent aux exigences du devis, et indiquerons que la certification CSA est requise pour l'approbation finale. L'entrepreneur devra donc procéder avec un DA avec la mention « resoumettre » jusqu'à ce que la certification CSA de l'équipement puisse être fournie.

Afin de réconforter tous les intervenants, il serait pertinent de fournir dès que possible la liste des produits similaires vendus au Canada et d'indiquer clairement les unités certifiées CSA. Il serait aussi intéressant de voir un exemple de certificat CSA fourni pour un produit similaire.

Voici les questions en rouge qui ont été posées au manufacturier ainsi que leur réponse en mauve:

3. Seguin Morris : The customer wants a CSA certification. Has your supplier ever done such certification before? Please confirm.

Manufacturier : If clients want a CSA certificate with CSA lable, we are confiming the extra test fee and test content & Days from third party CSA GROUP. They Will try to feedback you within this week.

4. Seguin Morris : Please provide a summary of how the CSA certification is handle.

Manufacturier : Confirming.

5. Seguin Morris : As per my previous email, please provide a Canadian List of recent customers who ordered sizeable transformers (1000 kVA and higher)

Manufacturier : Attach is the part of client list. Still being updated.

2023-11-17

Bonjour,

Voir nos commentaires plus bas en vert.

SVP ajouter cette série d'échange (avec réponses) au DA et le resoumettre.

Merci beaucoup!

Bonjour,

Voici des commentaires par SEGUIN MORRIS :

Voici les réponses du fournisseur pour le transformateur 3000kVA. Veuillez svp indiquer que nous aimerions avoir une réponse rapide afin de relâcher la production de ce transformateur pour minimiser tout impact sur le projet.

Série de commentaires #1. Les commentaires originaux sont en noir, les réponses du fournisseur en rouge et mon commentaire en bleu.

1. La capacité 3000KVA annoncée ne correspond pas aux informations sur le dessin d'atelier.
Sorry for typo, this can be modify to 3000KVA

WSP : OK.

1. Doit respecter la norme CSA C802.2, Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec.
Three phases pad mounted transformer should built to CSAC227.4, efficiency value in CSA C 802.1, we can add 802.1 on the nameplate.

WSP: Tel qu'indiqué plus bas, la norme indiquée originalement par WSP (C802.2) n'est pas adéquate. La norme C227.4 est en effet adéquate en ce qui concerne les essais sur l'équipement.

1. Changeurs de prises de tension avec dispositif de cadenassage;
Okay. The tap changer will add padlocking device description.

WSP : OK.

1. Compartiment primaire muni d'un dispositif à clé Kirk lié à la source (section 26 18 41 devis) et retenue de porte;
We can supply this , if Kirk key model TYPE D available for clients using?

WSP : OK. À coordonner par l'entrepreneur.

1. Connexion des bus secondaires verticales
[Seguin Morris] : les connexions des bus secondaires sont verticales. Voir la vue en plan ci-dessous. L'ouverture sur le dessus du transformateur est de 178x711

WSP : OK.

Série de commentaires #2. Les commentaires originaux sont en noir, mes traductions en rouge, les réponses du fournisseur en bleu et mon commentaire en vert.

WSP : Note que mon commentaire #2 n'est pas approprié, désolé. Car, ne concerne que les transformateurs secs. Il s'agit en réalité du CAN/CSA-C2-M91 (Version en vigueur), Single-Phase and Three-Phase Distribution.

WSP : Le fournisseur ne semble pas confirmer la norme indiquée ici.

1. Le socle doit être adapté au poids de nouveau transformateur
[Seguin Morris] : le socle sera adapté au poids du nouveau transformateur

WSP : OK.

1. Les connecteurs de mise à la terre doivent être acceptés jusqu'à 250MCM
We confirm that the ground connectors accept up to 250 MCM

WSP : OK.

1. Type ONAN
We confirm that the type is ONAN

WSP : OK.

1. Fabriqué en acier.
We confirm that the transformer tank is made of mild steel.

WSP : OK.

Série de commentaires #3. Les commentaires originaux sont en noir, mes traductions en rouge, les réponses du fournisseur en bleu et mon commentaire en vert.

Simplement pour ajouter qu'il faudra se référer au devis pour les questions de tests (essais) et à la section 26 05 01 pour les autres exigences générales.

Prendre en compte l'item important ci-dessous, histoire de gagner du temps pour le traitement des prochains DA.

Section 26 12 19

1 Soumettre au chargé de projet, pour chaque transformateur, le certificat des essais normalisés ayant été effectués en usine ainsi que le certificat de l'essai de type de chaque appareil avec ses accessoires haute tension, selon la norme CSA C2.

The transformers will be factory tested in accordance with the experimental standards of IEEE C57.12.00 and CSA C227.4 before transportation. After passing the test, a factory test report will be issued to the customer for confirmation. After receiving the customer's confirmation, transportation will begin.

WSP : Nous comprenons ici l'engagement à fournir les résultats des essais tel qu'exigé au devis. OK.

The project did not mention the need for additional third-party testing before confirming the contract.

If a CSA stickers /label needs to be affixed before shipment, The CSA GROUP will then issue a witness test report and request the additional CSA third-party testing fee .

According to our experience, Factory Test Report is generally sufficient, but if customers now force third-party testing or any other Type Test and CSA labels to be included with the goods, the testing fee will need to be updated, and the testing time will also take more than 8-10 weeks.

Please confirm the drawings and test.

[Seguin Morris] : Lors de notre réunion TEAMS, il a été mentionné que le transformateur devait être certifié CSA. Après avoir consulté le devis, il ne semble pas avoir d'exigence à une certification CSA mais bien une exigence à se conformer aux normes CSA. Voici des extraits de la section 26 12 19 ci-dessous.

WSP : Nous avons effectué certaines recherches et avons compris que le produit et/ou le fabricant ne sont pas listés chez CSA. On peut donc comprendre qu'aucune ligne de produit n'est autorisée à être vendue au Canada. Nous comprenons que l'approbation CSA se fait donc à la pièce chez le fabricant. La certification sera requise tel qu'indiqué au devis 26 05 01 et ailleurs dans les documents, peu importe votre lecture du devis, il ne s'agit pas seulement de construire selon les normes CSA, il faut aussi avoir la certification, surtout qu'il s'agit d'un produit asiatique.

Pour cette situation particulière, WSP n'est pas à l'aise d'apposer un tampon d'approbation sur le DA. Nous pouvons toutefois valider que l'ensemble des éléments techniques répondent aux exigences du devis, et indiquerons que la certification CSA est requise pour l'approbation finale. L'entrepreneur devra donc procéder avec un DA avec la mention « resoumettre » jusqu'à ce que la certification CSA de l'équipement puisse être fournie.

Afin de réconforter tous les intervenants, il serait pertinent de fournir dès que possible la liste des produits similaires vendus au Canada et d'indiquer clairement les unités certifiées CSA. Il serait aussi intéressant de voir un exemple de certificat CSA fourni pour un produit similaire.

2 PRODUITS

2.1 Matériaux/matériels

.1 Transformateurs triphasés montés sur socle pour installation extérieur, conformes à la norme

2.8 Identification des matériels

.2 Plaques signalétiques portant les renseignements pertinents, selon la norme CSA C2.

2.10 Contrôle de la qualité à la source

.1 Soumettre au chargé de projet, pour chaque transformateur, le certificat des essais normalisés ayant été effectués en usine ainsi que le certificat de l'essai de type de chaque appareil avec ses accessoires haute tension, selon la norme CSA C2



JIEZOU POWER GROUP

SHENYANG JIEZOU POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

JIEZOU POWER

meghan@jiezougroup.com Phone:8618804036118(whatsapp/Skype)

EXPERIENCE & SALES : RELEVANT PROJECTS COMPLETED BY THE PRODUCTS' MANUFACTURER

Name and Country of Purchaser	Address of Purchaser (give also fax number and/or email address)	Details of Products MANUFACTURED and SOLD	Contract Commencement Date & Contract Completion Date
1.Recycle Management, LLC	1049 Pleasant Valley Road Harrisonburg, VA 22801,	1500 kVA Padmount Transformer,	21th-June.-2022
2.Owens Construction Services LLC	6015 st.vincent avenue Shreveport , La 71106,	30kva dry transformer	13th-Sep.-2022
3,Productos del Alto.	Él tuque industrial park ,Carr# PR591,Km 0.2 Solar 2,Ponce, Puerto Rico 00728	75KVA pole mounted transformer	9th-Sep-2022
4,Atlanta Granite Pros LLC	371 Pike Blvd suite 350 Lawrenceville,GA 30046	50kva dry transformer	6-Sep-2022
5, Larson Electronics LLC	9419 E US HWY 175, Kemp, TX 75143	100kva single phase pad mounted transformer	3-Dec-2022
6,Caribbean Cabinets Products	Carr #1 KM 1 14. 1 bo singapur Juana Diaz PR.	100kVA single phase pole mounted transformer	1-Jan-2023
7,Electric Hydrogen	1 Strathmore Road Natick, MA, 1760,	3000kva dry transformer	6-March-2023

8,Real Toomim LLC	121 S WISER LNMOSES LAKE, WA 98837	3000 KVA, 3phase padmount oil-filled transformer	16-July-2022
9,Intellogic Engineering Inc.	Suite #1012, 260-22529 Lougheed Hwy, Maple Ridge, British Columbia V2X 0T5,	500 KVA, 3phase padmount oil-filled transformer	06-March-2022

meghan@jiezougroup.com Phone: 86 18804036118 (whatsapp/Skype)

ADD: 3316 Yanlord Land Plaza , Qingnian Avenue, Shenhe District, Shenyang City,Liaoning Province CHINA

Voici la réponse du fournisseur au sujet de l'approbation CSA :

"As you know our cost for a full CSA SPE 1000 Inspection and Certificate Report for your Chinese Transformer is \$3,000.00.

The sample report is included for reference purposes only, however it does detail the inspection quite thoroughly.

Along with that you will require a full Satisfactory Factory Test Report for Canadian use.

The sample report is also included for reference purposes only.

Attached is the complete quote for your review and customer consideration below:

A Full CSA SPE 1000 Inspection and Certificate Report
A complete FAT with report and visual inspection of the general condition.

NOTE: Any CSA Non-compliant issues will be noted and subject to additional repair costs at the customer's expense.

CSA Report : Price: \$3,000.00/unit

FAT Report : Price: \$3500.00/unit

Total **\$6,500.00 Plus Taxes."**

SPECIAL ELECTRICAL EQUIPMENT INSPECTION INSPECTION SPECIALE D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE			
Submitter / Réquérant: Surplec HV Solutions		Page: 1 of / De 4	Report No./ No. Rapport: 2023-BM-0464
Contact / Contact: Frank Svenshek Client # / # De Client:		Equipment Description / Description de l'équipement:	
Address / Adresse: 50 Manitoba Way		Padmount Transformer	
M.D.Y / M.J.A: 09/29/2023	City / Ville: Spruce Grove	MARKING / MARQUAGE	
Province: Alberta	Postal / Code Postal : T7X 0V5	Model / Modèle: 2500KVA Padmount	
Tel / Tél.: 780-628-1317	Email / Courriel: franksvenshek@surplec.com	Mfr. / Fab.: Surplec HV Solutions	Amps: 2500KVA
EQUIPMENT IS AVAILABLE FOR INSPECTION AT (If different than above) L'EQUIPEMENT EST DISPONIBLE POUR INSPECTION AU (Si adresse differente)		Volts : 24940/600	Hz : 60
		Watts :	Phase : 3
Location / Emplacement :		Connection: Permanent ☒ Cord/Cordon	
Address / Adresse :		Plugtype / Type de fiche :	
		HAS EQUIPMENT BEEN LISTED BY ANOTHER TESTING AGENCY ? L'EQUIPEMENT EST-IL DEJA CERTIFIE PAR UN AUTRE ORGANISME? Yes/Oui No / Non ☒	
City / Ville :	Province :	ETL	UL
Postal / Code Postal :	Tel :	FILE NO./NO DE DOSSIER: Built to Can CSA C227.4	

CONSTRUCTION	P/C	F/N	N/A	CONSTRUCTION	P/C	F/N	N/A
1. Enclosure/Boitier	☒			7. Overload/protection de surcharge			☒
2. Openings/Ouverture	☒			8. Overcurrent/protection de surintensité			☒
3. Components/Composants	☒			9. Bonding grounding/Mise à la masse, terre	☒		
4. Comp mounting/Montage de comp.	☒			10. Supply cord/Cordon d'alimentation			☒
5. Internal wiring/Filage interne	☒			11. Marking/Marquage	☒		
6. Clearance/Espacement	☒						

P/C – Passed/Conforme

F/N – Failed/Non conforme

N/A – Non applicable/Non applicable

Sample Size/
Grandeur d'échantillon :

Batch Size/
Nombre d'échantillon :

WERE ADDITIONAL RELATED STANDARDS USED IN THIS EVALUATION? YES ☒ / NO ☐ DES NORMES RELATIVES ADDITIONNELLES ONT-ELLES ETES UTILISEES ? OUI ☐ / NON ☐				STANDARD(S) USED: CSA C227.4 NORMES(S) UTILISEE(S) :			
#	SERIAL # / # DE SERIE	LABEL / ETIQUETTE	#	SERIAL # / # DE SERIE	LABEL / ETIQUETTE		
1	1551701007	C2282252	6				
2			7				
3			8				
4			9				
5			10				

Alterations Required / Modifications requises	Yes/Oui	No/Non	Alterations Completed/ Non-conformités corrigées	Yes/Oui	No/Non
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

LABEL NUMBERS ISSUED :
NUMEROS D'ETIQUETTES EMISES : FROM / DE: **C2282252** TO / A:

I/WE AGREE TO ABIDE BY THE CONDITIONS AND LIMITATIONS OF THE INTERTEK TESTING SERVICES ELECTRICAL EQUIPMENT INSPECTION SERVICE AGREEMENT AND TO PAY ALL COSTS IN CONNECTION WITH THE EXAMINATION, TESTING AND LABELLING OF THE ABOVE EQUIPMENT.
J'NOUS ACCEPTEONS DE NOUS CONFORMER AUX CONDITIONS ET LIMITATIONS DE L'ACCORD DE SERVICE D'INSPECTION D'EQUIPEMENT ET A PAYER TOUS LES FRAIS SE RATTACHANT AUX EVALUATIONS, ESSAIS ET MARQUAGE DE L'EQUIPEMENT MENTIONNE CI-DESSUS.

Frank Svenshek

Brian Magega

Print Name / Lettres moulées

Print name / Lettres moulées

Submitter's Signature/Signature du réquérant

Inspector's Signature/Signature de l'inspecteur

09/29/2023

M / D / Y – M / J / A

(READ PAGE 4 BEFORE SIGNING – LIRE PAGE 4 AVANT DE SIGNER)

Labels/Etiquettes		@	\$ 0.00
Labels/Etiquettes		@	\$ 0.00
Name plate/Plaque signalitique		@	\$ 0.00
Inspection Hrs/ Hres		@	\$
Travel Hrs / Hres de transport		@	\$
KM		@	\$ 0.00
Expenses/Dépenses		@	\$ 0.00
PAYMENT METHOD		Subtotal	\$
MODE DE PAIEMENT		Sous Total	\$
Credit card/carte de crédit		GST/TPS 5.0000	\$
AUTH # / # AUT		QST/TVQ 0.0000	\$ 0.00
CHEQUE #		HST/TVH 0.0000	\$ 0.00
P.O. #	PO07003628	TOTAL	\$


SPECIAL ELECTRICAL EQUIPMENT INSPECTION INSPECTION SPECIALE D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Submitter / Réquérant: Surplec HV Solutions

Page: 18 of / De 20

Report No./ No. Rapport: 2023-BM-0464

Critical Components / Composantes Critiques	Certified/Certifié	Yes/Oui	No/Non
Surplec HV Solutions/Ferranti Packard			✓
Padmount Transformer, 2500KVA, 24940-14400/600-347V, 60hz, 3ph			✓
Test Data on File			✓

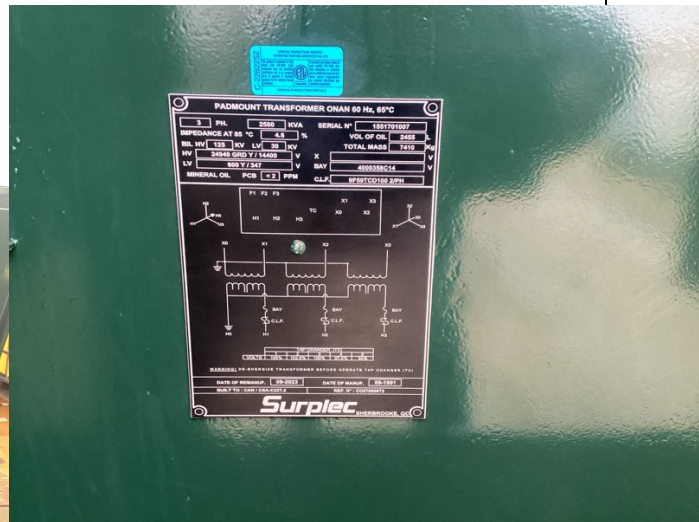

Equipment Inspection Service Agreement / Entente de service d'inspection d'équipement

I/We request Intertek to perform evaluation and testing of equipment to:
Je/Nous demande(ons) à ce que Intertek effectue des essais et évaluation d'équipement selon les normes:

CSA Special Publication, SPE-1000-21, model-code for the Field Evaluation of Electrical Equipment.
CSA publication spéciale, SPE-1000-21, code de référence pour l'évaluation à pied d'oeuvre d'équipement électrique

This Model Code does not apply to the re-evaluation of equipment that has been rejected due to the results of a previous evaluation conducted by a certification organization through any other existing certification service.

We understand that the Special Inspection Service will not be considered as having been completed until payment in full has been received by Intertek. Intertek reserves the right to remove labels from any equipment related to a delinquent account.

We affirm that all cost incurred by Intertek to perform this service shall be borne by the submitter and that the test to be performed to evaluate the products have been disclosed and do not make Intertek or the authority liable in any way for non-performance or malfunction of the products during or subsequent to the tests.

We understand that this Special Inspection Service is not a substitute for Intertek Certification but rather a service offered by Intertek on behalf of participating Provinces and Territories in response to extenuating circumstances. We therefore understand that the final acceptance of our equipment is at the discretion of the local government electrical inspection authority having jurisdiction. We also understand that Intertek in no way implies that this evaluation will satisfy the requirements of other inspection authorities, especially the gas inspection authority, building inspection authority, Workers' Compensation Board etc.

We understand that the Special Inspection Service does not make provision for the documenting of the construction of our product; hence each and every future batch must be completely re-evaluated. We realize that if we wish to take advantage of the similarity of construction of future shipments we must apply for Intertek Certification.

We agree to indemnify and hold harmless Intertek, its members, directors, officers and employees against any and all liability and costs if any of the products of the accepted batch subsequently prove hazardous and by reason, or in consequence of, any acts or omissions of the clients, in respect of the right granted herein to us the Special Inspection Label in connection with the above product, whether authorized or unauthorized.

We understand that it is our responsibility to ensure that the Intertek inspector has examined all units as requested and will verify that the list of serial numbers examined is complete before the Intertek inspector leaves our premises.

We understand that if the Intertek label is damaged or deteriorates, it may void the approval. We understand that Intertek does not in any way guarantee the durability or adhesion properties of the Intertek label.

We agree that any liability attached to the Special Inspection Service to be borne by Intertek is limited to the fee charged.

We agree to inform Intertek if we become aware of any situation where a product/service/system bearing an inspection label could lead to a potential hazard, and to investigate and take appropriate corrective action in accordance with SCC Requirements and Guidance – Inspection Body Accreditation Program, if required.

In accordance with SCC Requirements and Guidance - Inspection Body Accreditation Program. The Standards Council of Canada is the final level in disputes between Intertek and the client regarding conformance with accreditation criteria. Both parties shall abide by all SCC decisions pertaining to accreditation criteria.

Ce code de référence ne s'applique pas à la réévaluation d'équipement qui a été rejeté dû aux résultats d'une évaluation précédente effectuée par un organisme de certification ou par tout autre service de certification.

Nous comprenons que le service d'inspection spéciale ne sera considéré comme étant complété que si un paiement complet a été reçu par Intertek. Intertek se réserve le droit de retirer les étiquettes sur tout équipement se rattachant à un compte délinquant.

Nous déclarons que les coûts encourus par Intertek pour assurer ce service sont à la charge du requérant et que les essais à exécuter pour évaluer les produits ont été rapportés et ne tiennent de quelque façon que ce soit Intertek ou les autorités responsables de la non-performance ou du mal fonctionnement des produits pendant et/ou après les essais.

Nous comprenons que le service d'inspection spéciale n'est pas un substitut au programme de certification d'Intertek mais plutôt un service offert par Intertek au nom des provinces et territoires participants en réponse à des circonstances atténuantes. Nous comprenons de ce fait que l'acceptation finale de notre équipement est à la discrétion des autorités ayant juridiction. Nous comprenons aussi qu'en aucun cas Intertek ne prétend que cette évaluation répondra aux exigences d'autres services d'inspection, particulièrement le service d'inspection du gaz, d'inspection en bâtiments, de la CSST etc...

Nous comprenons que le service d'inspection spéciale ne pourroit pas à la documentation de la construction de votre produit, par conséquent chaque lot futur devra être complètement réévalué. Nous réalisons que si nous souhaitons tirer profit de la similitude de la construction des expéditions futures nous devons souscrire au programme de certification d'Intertek.

Nous nous engageons à indemniser et à dégager Intertek, ses membres, directeurs, officiers et employés contre toute responsabilité, toute perte ou tout dommage résultant de réclamations, de requêtes, de coûts (incluant les frais juridiques), ou de jugements si le ou les produits(s) devenait (aient) dangereux découlant d'actes de négligence ou intentionnels de la part du client ou d'un tiers relativement au produit auquel est apposé l'étiquette d'inspection spéciale, qu'ils soient autorisés ou non.

Nous comprenons qu'il est de notre responsabilité de s'assurer que l'inspecteur d'Intertek ait examiné toutes les unités tel que demandé et vérifié que la liste des numéros de série est complète avant que celui-ci ne quitte les lieux.

Nous comprenons que s'il advenait qu'une étiquette soit détériorée ou endommagée cela pourrait invalider la reconnaissance de l'évaluation de notre produit. Nous comprenons qu'Intertek ne garantit pas la longévité ou les propriétés d'adhérence des étiquettes.

Nous consentons à informer Intertek si nous apercevons une situation là où un produit/service/système ayant une étiquette d'inspection peut conduire à un danger potentiel, et d'examiner et prendre l'action corrective appropriée conformément à exigences et lignes directrices du CCN – Programme d'accréditation des organismes d'inspection si requis.

Conformément aux exigences et lignes directrices du CCN – Programme d'accréditation des organismes d'inspection. Le Conseil Canadien des Normes est le niveau supérieur et final dans les litiges entre Intertek et le client en ce qui concerne la conformité aux critères d'accréditation. Les deux parties doivent

TEST CERTIFICAT

Project no: CO04000162
Client:
Client PO: 2061
Description: New pad
Serial number: DL2210124
Identification: 0
Date test: 2023-03-21
Type: Loop feed
Frequency: 60 Hz

Type: ONAN
Rating: 1250kVA
Vector: Dyn1
Primary Voltage(L/L): 12470V
Current: 57,9A
Tap: 5, +-2.5%
BIL: 95kV
Secondary Voltage (L/L): 400V
Current: 1804,2A

FACTORY ACCEPTANCE TEST

Insulation resistance	Temp:	18,0°C	Corr factor:	0,900			
	Description	Applied	Measure	Meas c.20°C	Require	Result	
	LV/Gnd	1000V	1610MΩ	1449MΩ	195MΩ	Pass	
	HV/LV	5000V	2340MΩ	2106MΩ	529MΩ	Pass	
	HV/Gnd	5000V	1660MΩ	1494MΩ	529MΩ	Pass	
Acceptance criteria: Following columnne require							
Turn to turn ratio	HV:	12470V	LV:	231V			Result
	Measured ratio			Variation (%)			Pass
	S	H1-H3/ X1-X0	H2-H1/ X2-X0	H3-H2/ X3-X0	H1-H3/ X1-X0	H2-H1/ X2-X0	H3-H2/ X3-X0
	P						Theorical
	1	56,666	56,662	56,665	-0,05%	-0,06%	-0,06%
	2	55,329	55,328	55,333	-0,03%	-0,03%	-0,02%
	3	53,997	53,994	53,998	0,00%	0,00%	0,00%
	4	52,661	52,661	52,664	0,03%	0,03%	0,03%
	5	51,328	51,326	51,328	0,06%	0,06%	0,06%
		Acceptance criteria: +-0.5% theorical value					
Winding resistance	Temp (°C):	18,0	Cor factor:	1,008			
	LV windings meas. (mΩ)			LV windings corr. 20°C (mΩ)			
		X1-X0	X2-X0	X3-X0	X1-X0	X2-X0	X3-X0
		0,564	0,552	0,807	0,569	0,557	0,814
				Pass			
	HV windings meas. (Ω)			HV windings corr. 20°C (Ω)			
	TC	H1-H3	H2-H1	H3-H2	H1-H3	H2-H1	H3-H2
	1	1,113	1,110	1,107	1,122	1,119	1,116
	2	1,081	1,082	1,079	1,090	1,091	1,088
	3	1,052	1,053	1,051	1,061	1,062	1,060
	4	1,024	1,024	1,022	1,032	1,032	1,030
	5	0,992	0,993	0,991	1,000	1,001	0,999
		Acceptation criteria: +/- 3% mean value					
Dissipation factor and capacitance	Temp:	18°C	Corr factor:	0,951			
	Description	DF Meas. (%)	DF C. 20°C (%)	Cap (pF)	Result:		
	CH-L+CH-G	0,440	0,419	6389	Pass		
	CH-G	0,152	0,145	1474	Pass		
	CH-L	0,456	0,434	4913	Pass		
	CL-G	0,547	0,520	5043	Pass		
	CL-H+CL-G	0,538	0,512	9952	Pass		
		Acceptance criteria: DF <=1.0%					

TEST CERTIFICAT



Applied Voltage	Winding	Voltage (kV)	Duration (sec)		Result:
	HV	34,00	60		Pass
	LV	10,00	60		Pass
	Acceptance criteria: Withstand				
Induce Voltage	Level				Result:
	200%				Pass
	Acceptance criteria: Withstand				
No load loss	No load m.(kW)	Current (%)			Result:
	1,495	0,20			Pass
	Acceptance criteria: For reference only				
Load loss	Load loss 85°C (kW)		Total loss (kW)	Z(%) meas.	Result:
	15,12		16,61	5,55%	Pass
	Acceptance criteria: For reference only				

Tested: Dritan Caku
Test technician

Verify: 
Eric Blanchet, ing. OIQ: 109976
